
CRONOGRAMA FÍSICO DA SE DISTRITO INDUSTRIAL - DMED

ITEM	ATIVIDADE	INÍCIO DO PLANO	DURAÇÃO DO PLANO
1	**OBRAS CIVIS**		
1.1	Instalação do Canteiro Obras	35	4
1.2	Locações (Sondagens e Gabaritos)	39	4
1.3	Construção do Muro Perimetral	39	16
1.4	Drenagem Pluviais	43	12
1.5	Fundações e Bases dos Pórticos	43	16
1.6	Construção de Canaletas	43	9
1.7	Fundações e Bases dos Transformadores de Força	43	13
1.8	Fundações e Bases dos Disjuntores e Seccionadoreas	43	12
1.9	Casa de Controle - Infra Estrutura	43	26
2	**MONTAGENS ELETRO-MECÂNICAS**		
2.1	**MONTAGEM DISJUNTORES de 138Kv**		
2.1.1	Montagem Eletromecanica	63	6
2.1.2	Comissionamento	69	2
2.2	**MONTAGEM SECCIONADORAS 138 KV**		
2.2.1	Montagem Eletromecanica	55	16
2.2.2	Comissionamento	71	4
2.3	**MONTAGEM BANCO DE CAPACITORES**		
2.3.1	Montagem Eletromecanica	53	2
2.3.2	Comissionamento	56	1
2.4	**MONTAGEM PARA-RAIOS**		
2.4.1	Montagem Eletromecanica	56	2
2.4.2	Comissionamento	58	1
2.5	**MONTAGEM TRANSFORMADORES DE INTRUMENTOS**		
2.5.1	Montagem Eletromecanica	63	6
2.5.2	Comissionamento	69	3
2.6	**MONTAGEM TRANSFORMADORES DE FORÇA**		
2.6.1	Montagem Eletromecanica	58	4
2.6.2	Comissionamento	62	2
2.7	**MONTAGEM CUBÍCULOS BLINDADOS MT**		
2.7.1	Montagem Eletromecanica	73	6
2.7.2	Comissionamento	79	2
2.8	**MONTAGEM PAINÉIS DE BT**		
2.8.1	Montagem Eletromecanica	69	20
2.8.2	Comissionamento	89	4
3	**COMISSIONAMENTO**	93	12
4	**START-UP - ENERGIZAÇÃO**	105	2

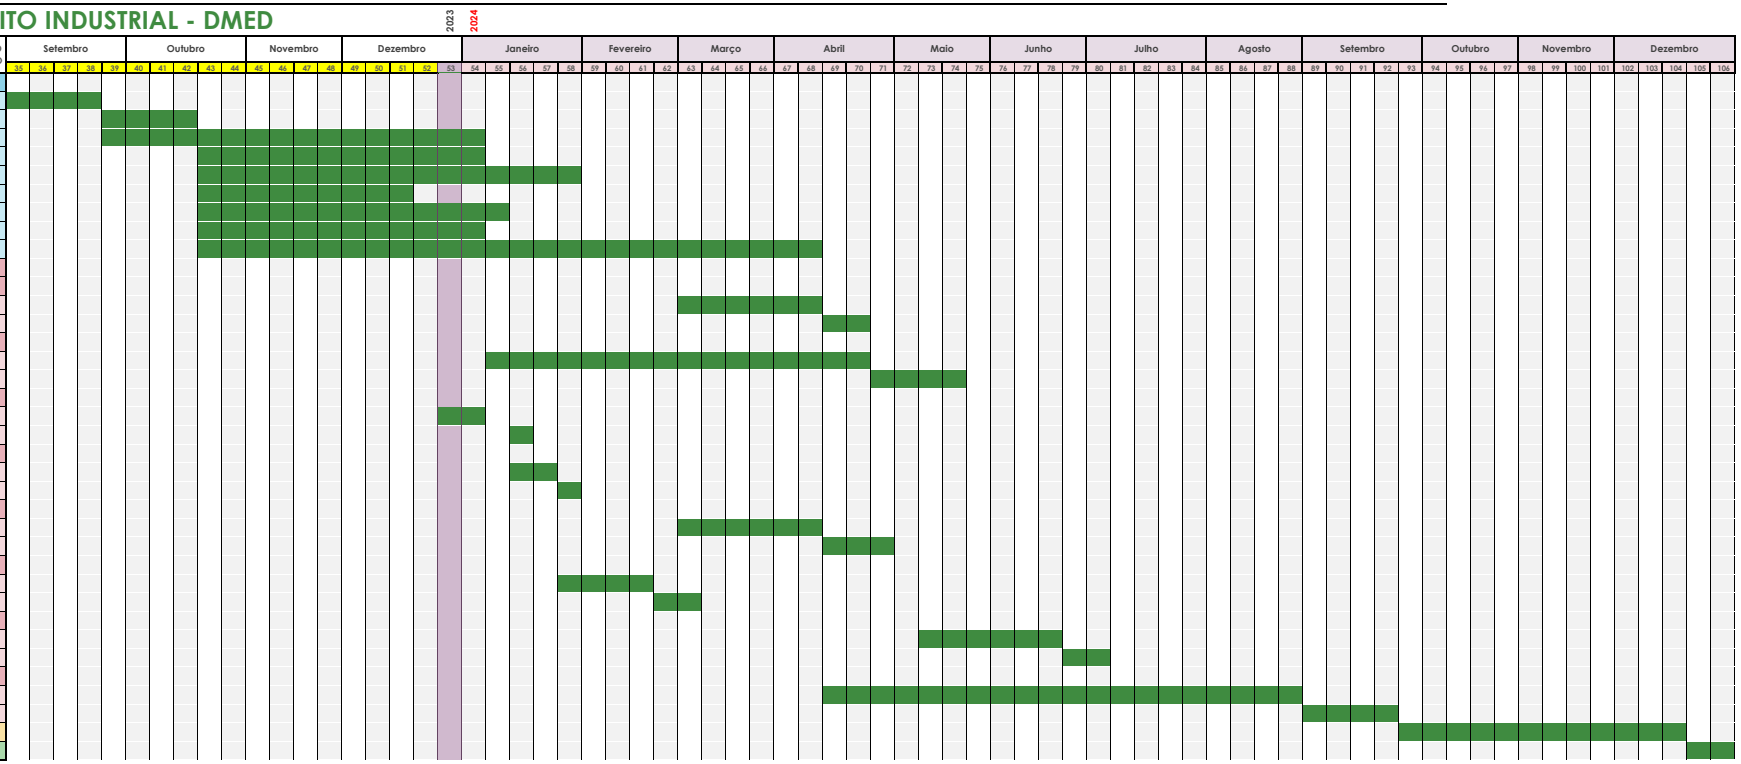

CASSIANO PIRES VILAS BOAS:08310182678

Assinado de forma digital por CASSIANO PIRES VILAS BOAS:08310182678
Dados: 2023.06.30 14:02:54 -03'00'
